

	0	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	oct '18 1 8	3   15
1		Proyecto	245 días	lun 15/10/18	vie 13/12/19			50%		
2	<b>~</b>	Análisis y Planeación	47 días	lun 15/10/18	mar 5/02/19		servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcea	<b>100%</b> n		
3	<b>~</b>	Programación estructurada	5 días	lun 15/10/18	vie 19/10/18		Anderson Stiven Yaguma Diaz;Jhostin	100%		
4	<b>~</b>	Levantamiento de información	5 días	lun 22/10/18	vie 26/10/18	3	Anderson Stiven Yaguma Diaz	100%		
5	<b>~</b>	Aplicación de técnica de levantamiento de información	5 días	lun 29/10/18	vie 2/11/18	4	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Jhostin David Cespedes Campo;Otoniel	100%		
6	<b>√</b> ¶	Análisis de la información	5 días	lun 5/11/18	vie 9/11/18	5	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Jhostin	100%		
7	<b>~</b>	Componente Metodológico	27 días	lun 12/11/18	mar 5/02/19	6		100%		
8	<b>~</b>	Nombre del proyecto	4 días	lun 12/11/18	jue 15/11/18	1	Anderson Stiven Yaguma Diaz	100%		
9	<b>✓</b>	Objetivo Gen	5 días	vie 16/11/18	jue 22/11/18	8	Otoniel Hernández Ga	r. 100%		
10	<b>~</b>	Objetivo Específicos	5 días	vie 23/11/18	jue 29/11/18	9	Otoniel Hernández Garzon	100%		
11	<b>~</b>	Planteamient del Problema		vie 30/11/18	jue 6/12/18	10	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Jhostin David Cespedes	100%		
12	<b>~</b>	Alcance del proyecto	5 días	vie 7/12/18	jue 13/12/18	11	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Otoniel	100%		
13	<b>~</b>	Justificación	3 días	vie 14/12/18	mar 5/02/19	12	Anderson Stiven Yagu	r 100%		
			Tarea			Resumen inactivo	Tare	as externas		
			División			Tarea manual	Hito	externo $\diamondsuit$		
			Hito	•		solo duración	Fech	a límite 👢		
-		agrama de gantt.m	Resumen	_		Informe de resumen manual		ıreso —		
echa	a: vie 28	/06/19	Resumen del pro	ovecto -		Resumen manual		reso manual —		
			Tarea inactiva	.,	a	solo el comienzo	Γ			
			Hito inactivo			solo fin	3			
						Página 1				—


G	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	oct '18 1 8	
4		45 días	lun 4/02/19	lun 8/04/19		servicios basicos[1 Me	100%		_
15	Requerimientos Funcionales	4 días	lun 4/02/19	vie 8/02/19		Otoniel Hernández Garzon	100%		
6	Requerimientos No Funcionales	5 días	lun 11/02/19	lun 18/02/19	15	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Otoniel	100%		
7	BPMN	5 días	lun 18/02/19	vie 22/02/19	16	Otoniel Hernández Gar	100%		
8	Modelo Entidad Relación	5 días	lun 25/02/19	vie 1/03/19	17	Anderson Stiven Yaguma Diaz	100%		
9	Diagrama de Entidad y	10 días	lun 4/03/19	vie 15/03/19	18	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Otoniel	100%		
) <b>~</b>		5 días	lun 18/03/19	vie 22/03/19	19	Anderson Stiven Yaguma Diaz	100%		
<b>~</b>	Normalización de bases de	5 días	lun 25/03/19	vie 29/03/19	20	Otoniel Hernández Garzon	100%		
2	Prototipos y Mockup	10 días	lun 1/04/19	vie 12/04/19		Jhostin David Cespedes Campo	100%		
3	Desarrollo Etapa 1	30 días	lun 22/04/19	vie 31/05/19	22	servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcear	<b>92%</b> 1		
4	Base de datos	10 días	lun 22/04/19	vie 3/05/19		Anderson Stiven Yagun	r 100%		
5	Construcción de la Base de	10 días	lun 6/05/19	vie 17/05/19	24	Otoniel Hernández Garzon;Jhostin David	100%		
5	Datos insertados en la Base de Datos	5 días	lun 20/05/19	vie 24/05/19	25	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Otoniel Hernández Garzon	100%		
7	Consultas y Join en la Base y	5 días	lun 27/05/19	vie 31/05/19	26	Jhostin David Cespedes Campo	50%		
		Tarea			Resumen inactivo	Tarea	s externas		
		División			Tarea manual	Hito e	externo		
	D:	Hito	<b>•</b>		solo duración	Fecha	a límite 🔸		
-	o: Diagrama de gantt.m lie 28/06/19	Resumen	_	<del></del> 1	Informe de resumen manual	Progr	reso		_
ııa. V		Resumen del pro	oyecto 🗀		Resumen manual	Progr	reso manual —		_
		Tarea inactiva			solo el comienzo	E			
		Hito inactivo			solo fin	3			
					Página 2				_


d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	oct '18 1 8
28	Desarrollo Etapa 2	30 días	lun 1/07/19	vie 9/08/19	27	servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcean	0%	
29	Codificación y CRUD	10 días	lun 1/07/19	vie 12/07/19			0%	
30	Conexión de base de datos	10 días	lun 15/07/19	vie 26/07/19	29		0%	
31	CRUD Funcional módulos del sistema	10 días	lun 29/07/19	vie 9/08/19	30		0%	
32	Prueba de Software	40 días	lun 12/08/19	vie 4/10/19	31	servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcean	0%	
33	Prueba de caja negra	10 días	lun 12/08/19	vie 23/08/19			0%	
34	prueba de caja blanca	10 días	lun 26/08/19	vie 6/09/19	33		0%	
35	prueba de estré	10 días	lun 9/09/19	vie 20/09/19	34		0%	
36	prueba de unita	10 días	lun 23/09/19	vie 4/10/19	35		0%	
37	Modelo De Calidad	50 días	lun 7/10/19	vie 13/12/19	36	servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcean	0%	
38	Formatos de calidad	10 días	lun 7/10/19	vie 18/10/19			0%	
39	Elaboración de contratos	10 días	lun 21/10/19	vie 1/11/19	38		0%	





	0	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recu	rsos % completado		oct '18	
40	U	Construcción de calidad de usuario y operación	30 días	lun 4/11/19	vie 13/12/19	39			0%		15
			Toron			Postumon inactivo		Tarage outerpas			_
			Farea División			Resumen inactivo		Tareas externas			_
		1	División			Tarea manual		Hito externo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		_
Proye	ecto: Di	agrama de gantt.m	División Hito	• •		Tarea manual solo duración		Hito externo Fecha límite	•		_
Proye Fecha	ecto: Di v: vie 28	agrama de gantt.m 8/06/19	División Hito Resumen	<b>+</b>		Tarea manual solo duración Informe de resumen manual		Hito externo Fecha límite Progreso	•		
Proye Fecha	ecto: Di :: vie 28	agrama de gantt.m 8/06/19	División Hito Resumen Resumen del proy	<b>+</b>		Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual		Hito externo Fecha límite	•		
Proye Fecha	ecto: Di : vie 28	agrama de gantt.m B/06/19	División Hito Resumen	<b>+</b>		Tarea manual solo duración Informe de resumen manual		Hito externo Fecha límite Progreso	•		

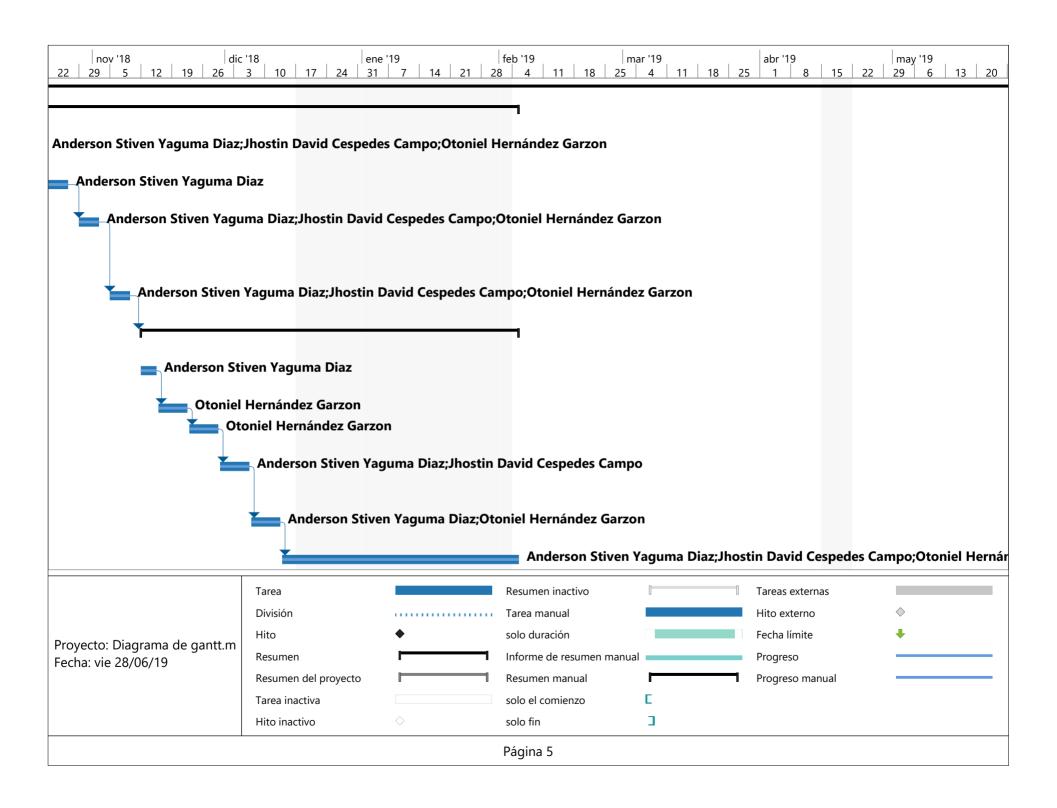


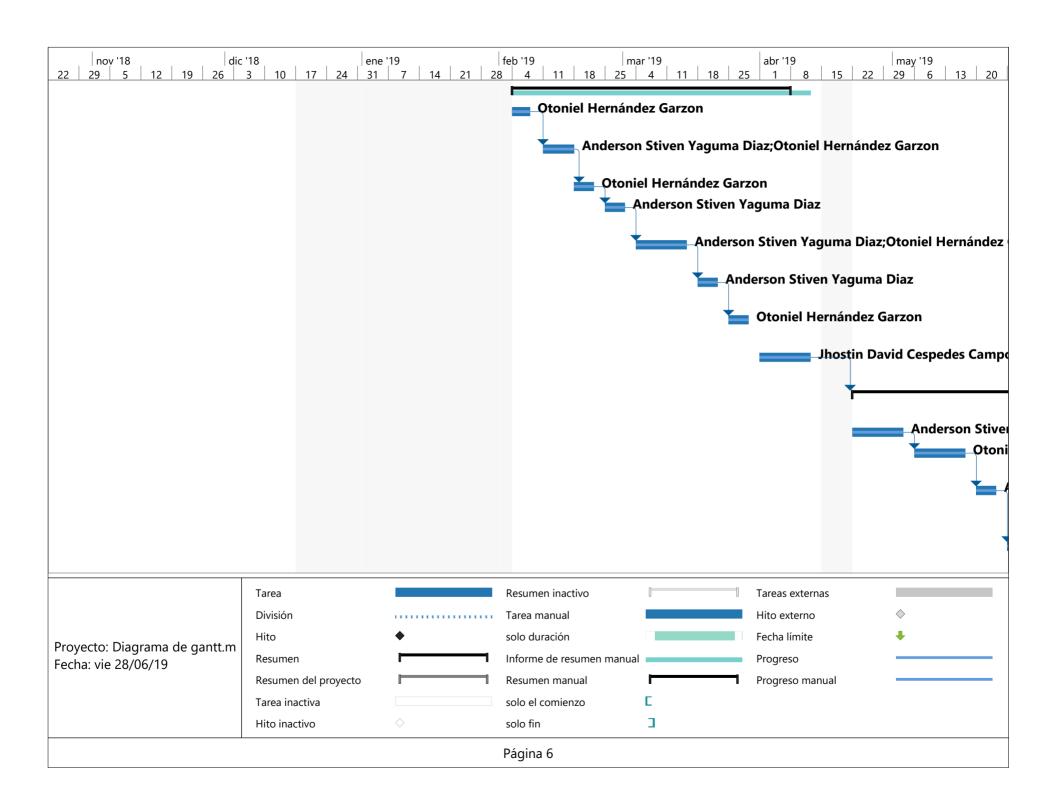


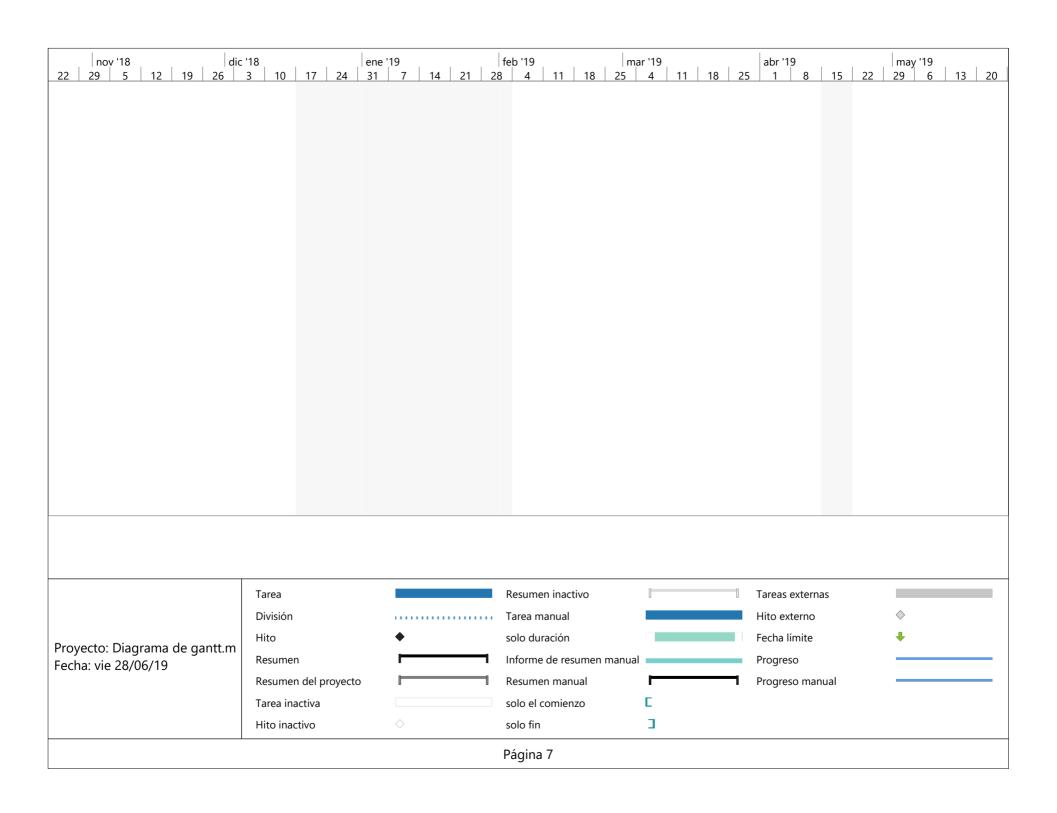


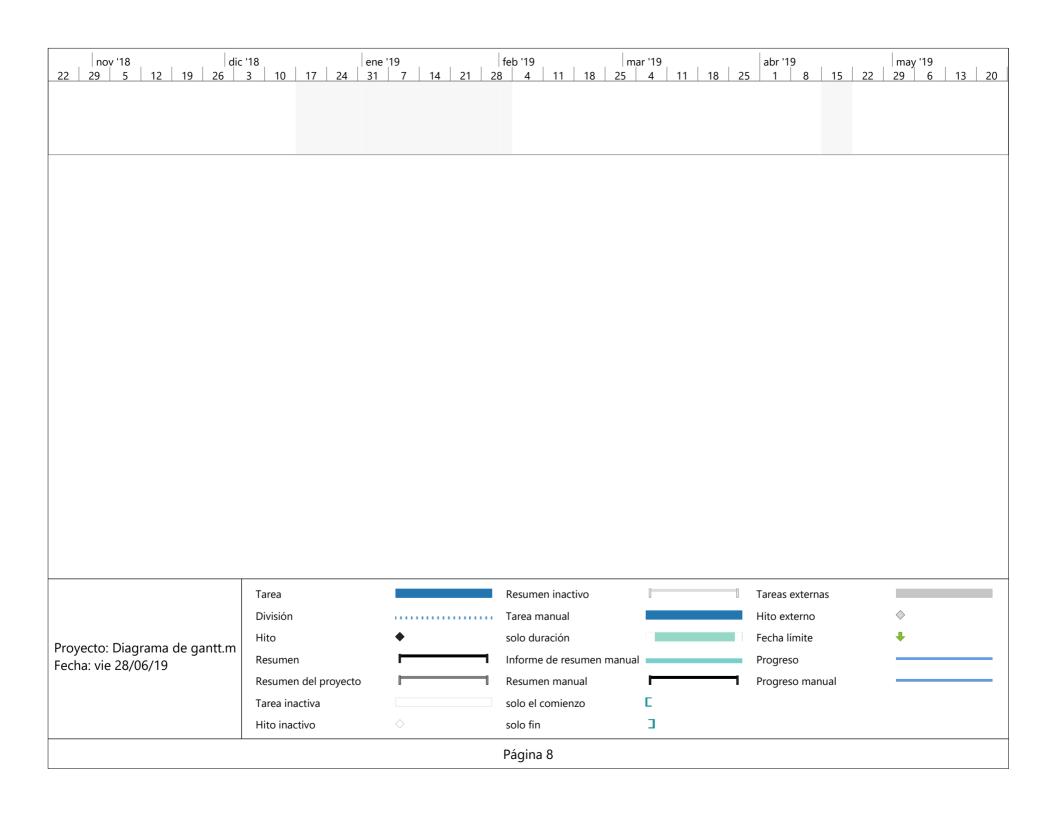

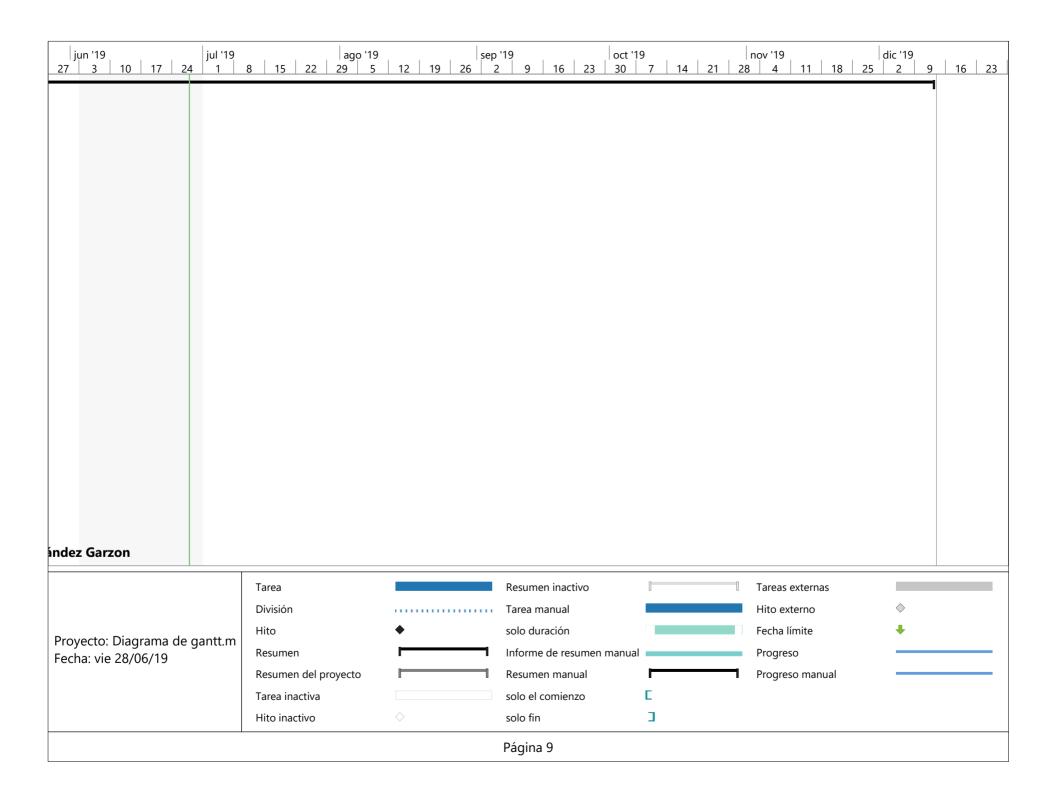

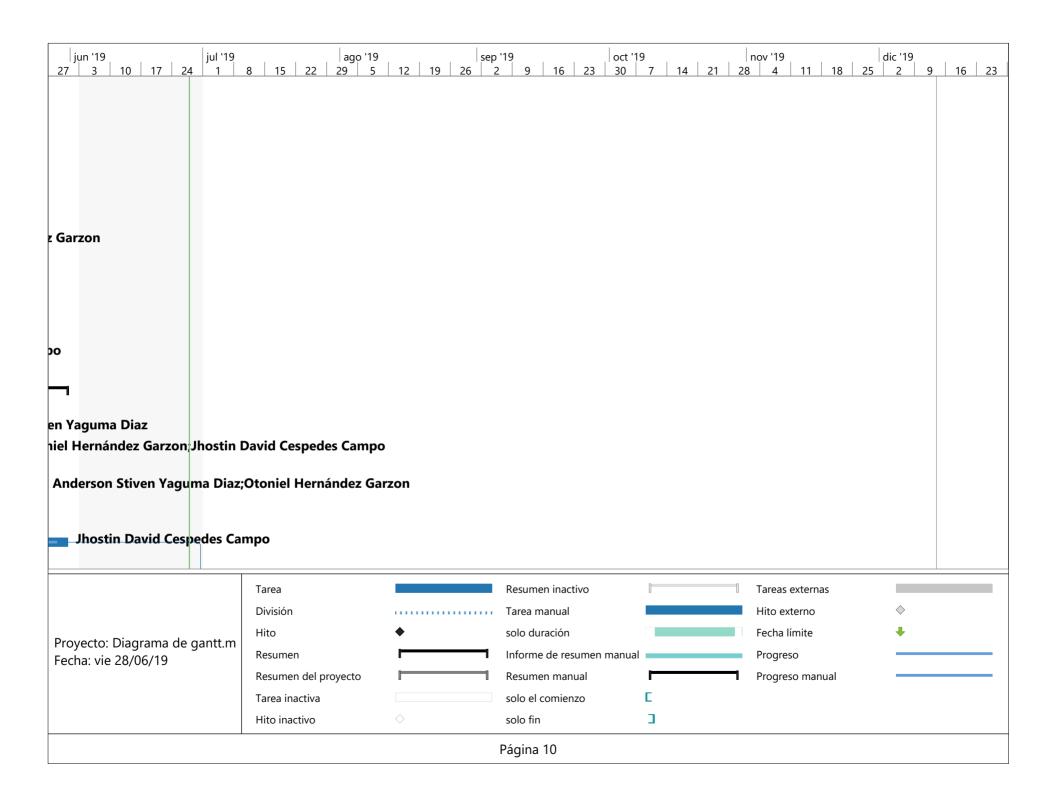

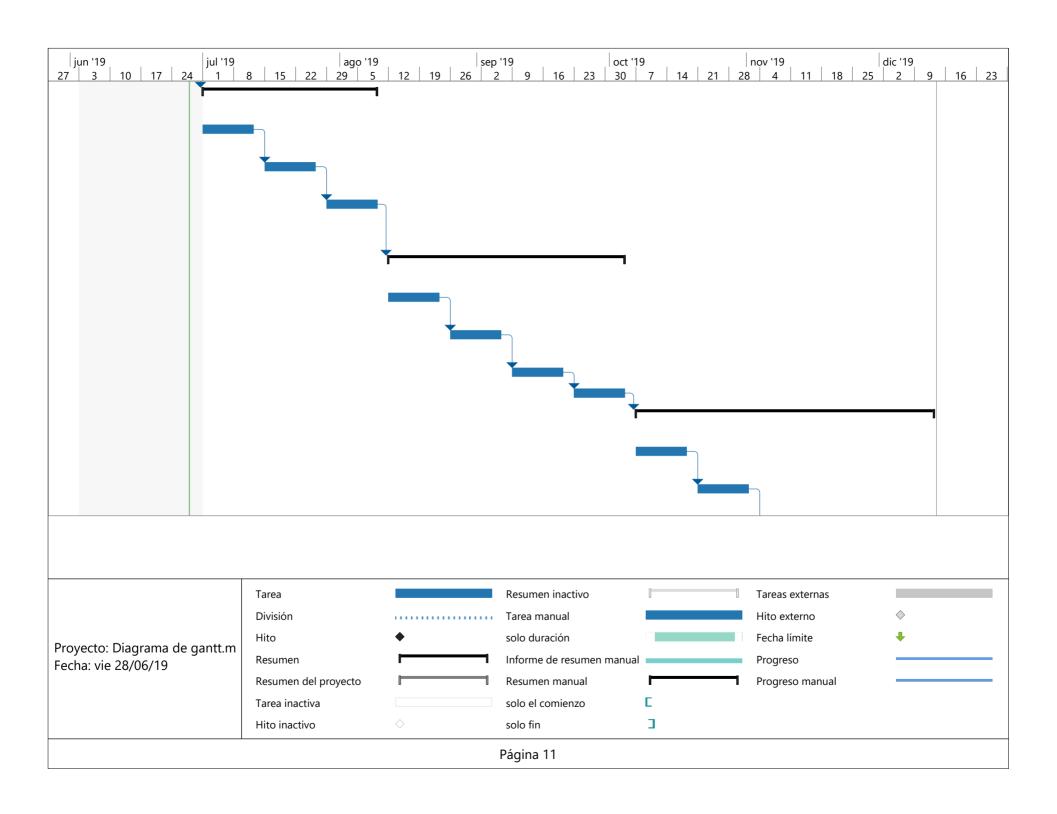

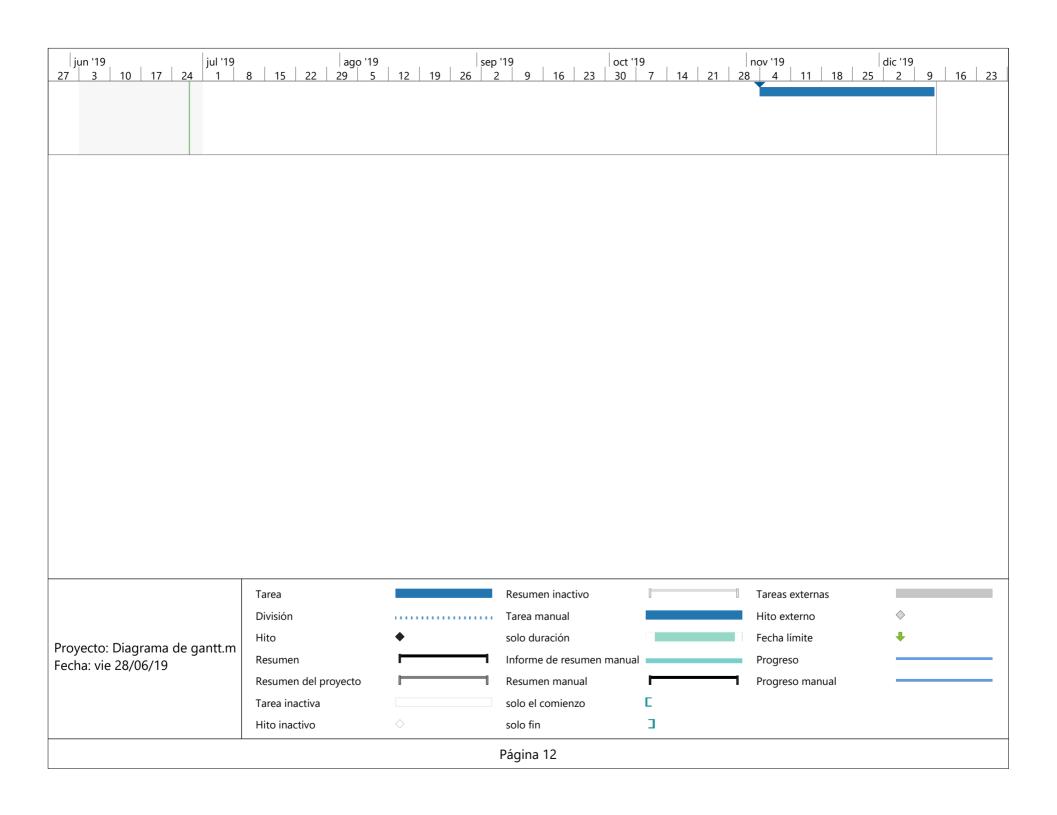

# INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

LUN 15/10/18 - VIE 13/12/19

\$ 25.032.500

**COSTO RESTANTE** 

\$ 5.178.042

% COMPLETADO

50%

# **ESTADO DEL COSTO**

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
Proyecto	\$ 19.854.458	\$ 5.178.042	\$0	\$ 25.032.500	\$ 25.032.500

### PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea 9 completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto ha superado el presupuesto.



# **ESTADO DE COSTO**

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

# Intente establecer una línea base

